

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

Ingeniería de Software

TABLERO DE SEGUIMIENTO FINANCE AI

Registro y análisis de finanzas personales con asistencia de IA

Integrantes

David Fernando Gonzalez Soler

Maycol Estiven Fonseca Muñoz

Ivan David Giraldo Garavito

Noviembre de 2026

REGISTRO DE CAMBIOS		
VERSIÓN	**FECHA DE CAMBIO**	**MOTIVO DEL CAMBIO**
1.0	13/11/2026	Elaboración inicial

CONTROL DEL DOCUMENTO			
VERSIÓN	**ELABORADO**	**REVISADO**	**APROBADO**
1.0	David Fernando Gonzalez Soler Maycol Estiven Fonseca Muñoz Ivan David Giraldo Garavito	N/A	Oscar Gómez

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN **4**

2 OBJETIVO **4**

3 TABLERO DE SEGUIMIENTO **4**

3.1 DATOS DEL TABLERO 4

3.2 METODOLOGÍA Y FLUJO DE TRABAJO 4

3.3 ESTADO ACTUAL DEL TABLERO 5

4 TRABAJO COMPLETADO **6**

4.1 PLANIFICACIÓN INICIAL 6

4.2 HISTORIAS DE USUARIO POR SPRINT 6

4.3 DIAGRAMAS, CALIDAD Y SOPORTE TÉCNICO 7

5 VELOCIDAD DEL EQUIPO **7**

6 RELACIÓN CON LA ENTREGA **7**

7 MANTENIMIENTO DEL TABLERO **8**

1 INTRODUCCIÓN

Este documento describe el tablero de seguimiento del proyecto **Finance AI**, que el equipo usa para planificar el trabajo, asignar responsables y registrar el avance de cada historia de usuario. El tablero está en Trello y sigue un flujo Kanban organizado en sprints.

El documento resume cómo se organiza el tablero, qué trabajo se completó en cada sprint, quién lo realizó y cuándo pasó a producción, y cómo se relaciona con el resto de la entrega.

2 OBJETIVO

Dejar evidencia verificable de la gestión del proyecto: planificación, reparto de responsabilidades, trabajo completado por sprint y velocidad del equipo, para que el docente pueda contrastarla con el tablero original.

3 TABLERO DE SEGUIMIENTO

3.1 DATOS DEL TABLERO

Tabla 1. *Datos del tablero.*

Dato	Detalle
Nombre	BALLBREAKERS Board · Finance · AI
Herramienta	Trello
Enlace	https://trello.com/b/jv4JzilH
Visibilidad	Privada; se accede por invitación a los miembros del tablero.
Miembros	dei_bid, maicolfonsecamunos, ferxo (usuarios de Trello)
Actividad registrada	Del 24/08/2026 al 14/11/2026.
Tarjetas	81 en total: 20 abiertas y 61 archivadas.
Etiquetas de sprint	S1 a S7. Cada historia lleva la etiqueta del sprint en que se planificó.

3.2 METODOLOGÍA Y FLUJO DE TRABAJO

El equipo aplica Scrum sobre un tablero Kanban. El trabajo avanza de izquierda a derecha por las siguientes listas:

Tabla 2. *Listas del tablero.*

Lista	Significado
Backlog	Trabajo identificado y priorizado que aún no se asigna a un sprint.
Sprint backlog	Historias comprometidas para el sprint en curso.
Dev	Historias en desarrollo.
Testing	Historias en verificación.
Deploy	Historias terminadas y publicadas. Al finalizar un sprint se archivan.
Done	Trabajo de apoyo terminado: planificación, diagramas y entregables.

Cada historia de usuario tiene su tarjeta, con el código de la característica del Product Backlog (`PB-xxx`), el enunciado «Como usuario quiero… para…», los puntos de historia, una lista de tareas, el responsable y la etiqueta de sprint.

3.3 ESTADO ACTUAL DEL TABLERO

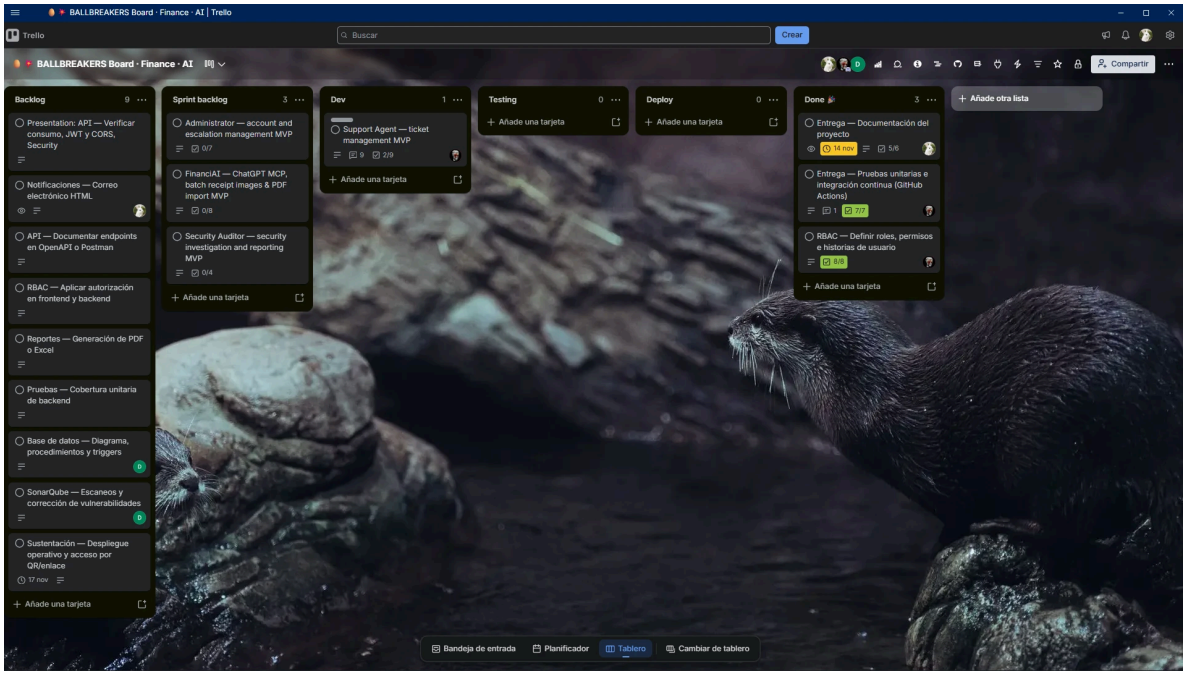


Figura 1. *Captura del tablero de seguimiento.*

Tabla 3. *Tarjetas por lista activa en la fecha de la exportación.*

Lista	Tarjetas abiertas	Tarjetas archivadas
Backlog	9	15
Sprint backlog	3	6
Dev	1	2
Testing	0	1
Deploy	0	17
Done	3	18

4 TRABAJO COMPLETADO

4.1 PLANIFICACIÓN INICIAL

Antes del primer sprint el equipo definió el alcance, la pila tecnológica, el modelo de datos, las características y la arquitectura, y preparó el Product Backlog con sus historias de usuario.

Tabla 4. *Tareas de planificación completadas.*

Tarea	Responsable	Fecha
Step 1: Define exact scope	Equipo	25/08/2026
Step 2: Research and decide the tech stack	Equipo	25/08/2026
Step 3: Design the database	Equipo	25/08/2026
Step 4: Define features with priorities	Equipo	25/08/2026
Step 5: Draw the architecture	Equipo	25/08/2026
Step 7: Mockups / visual prototype	Equipo	25/08/2026
Step 9: Define the team workflow	Equipo	25/08/2026
Step 10: Resolve design gaps	Equipo	25/08/2026
Preparar Product Backlog + Historias de Usuario	ferxo	07/09/2026

4.2 HISTORIAS DE USUARIO POR SPRINT

Se completaron 15 historias de usuario en cinco sprints. La fecha corresponde al paso de la tarjeta a la lista Deploy.

Tabla 5. *Historias completadas, por sprint.*

Sprint	HU	Historia	Caract.	SP	Responsable	Deploy
S1	HU-001	Register	PB-001	3	maicolfonsecamunos	24/09/2026
S1	HU-002	Login	PB-001	3	maicolfonsecamunos	08/09/2026
S2	HU-003	Accounts	PB-002	2	maicolfonsecamunos	14/09/2026
S2	HU-004	Categories	PB-003	2	maicolfonsecamunos	14/09/2026
S2	HU-005	Income Sources	PB-003	2	ferxo	14/09/2026
S3	HU-006	Manual Expense	PB-004	5	ferxo	21/09/2026
S3	HU-008	View Correct Delete Expenses	PB-004	5	dei_bid	21/09/2026
S3	HU-009	Income	PB-005	2	maicolfonsecamunos	22/09/2026
S3	HU-011	History	PB-007	2	dei_bid	29/09/2026
S4	HU-010	Transfers	PB-006	2	dei_bid	29/09/2026
S4	HU-015	Photo Capture	PB-010	Sin estimar	ferxo	29/09/2026
S4	HU-016	Budgets	PB-011	1	maicolfonsecamunos	29/09/2026
S5	HU-012	Dashboard	PB-008	3	ferxo	13/10/2026
S5	HU-013	Text Capture	PB-009	8	dei_bid	13/10/2026
S5	HU-014	Voice Capture	PB-009	3	maicolfonsecamunos	13/10/2026

4.3 DIAGRAMAS, CALIDAD Y SOPORTE TÉCNICO

Tabla 6. *Otras tareas completadas.*

Tarea	Responsable	Fecha
Remediación integral de accesibilidad (WCAG AAA, táctil, lectores de pantalla y copys U1–U4)	ferxo	13/10/2026
UI: Estandarización y simplificación de Finance AI	ferxo	13/10/2026
Diagrams - Architecture x1	ferxo	22/10/2026
Diagrams - Sequence x1	ferxo	22/10/2026
Diagrams - Activity x2	ferxo	23/10/2026
divide repo(back and front)	maicolfonsecamunos	23/10/2026
Diagrams - ER x1	maicolfonsecamunos	25/10/2026
Diagrams - Use Case x8	maicolfonsecamunos	25/10/2026
Entrega: Pruebas unitarias e integración continua (GitHub Actions)	ferxo	04/11/2026
CI: Evidenciar GitHub Actions	Equipo	04/11/2026
Entrega: Documentación del proyecto	maicolfonsecamunos	13/11/2026
RBAC: Definir roles, permisos e historias de usuario	ferxo	13/11/2026

5 VELOCIDAD DEL EQUIPO

La velocidad se calcula con los puntos de historia de las tarjetas completadas en cada sprint.

Tabla 7. *Puntos de historia completados por sprint.*

Sprint	Historias	Puntos (SP)	Sin estimar
S1	2	6	N/A
S2	3	6	N/A
S3	4	14	N/A
S4	3	3	HU-015
S5	3	14	N/A
Total	15	43	

El equipo completó 43 puntos en 5 sprints, con un promedio de 8.6 puntos por sprint. La historia HU-015 figura sin estimar en el tablero, por lo que no suma puntos. El cálculo está en el archivo `Velocidad Scrum - Finance AI.xlsx`.

6 RELACIÓN CON LA ENTREGA

Tabla 8. *Entregables y su evidencia.*

Elemento de la entrega	Evidencia
Manual de usuario	docs/entrega/Manual de usuario - Finance AI (Word y PDF).
Manual técnico	docs/entrega/Manual tecnico - Finance AI (Word y PDF).
Diccionario de datos	docs/entrega/Diccionario de datos - Finance AI (Word, PDF, Excel y SQL).
Tablero de seguimiento	Este documento, el tablero de Trello y los archivos `Product Backlog y HU - Finance AI.xlsx` y `Velocidad Scrum - Finance AI.xlsx`.
Repositorio	Servidor, cliente y documentación (ver enlaces abajo).

Tabla 9. *Repositorios del proyecto.*

Repositorio	Dirección
Servidor (FastAPI)	https://github.com/Maicol2363/finance-ai-backend
Cliente (Flutter)	https://github.com/Maicol2363/finance-ai-frontend
Documentación	https://github.com/NullCorvus/finance-ai

7 MANTENIMIENTO DEL TABLERO

Las tarjetas se mueven entre listas según su avance. Al terminar una historia se mueve a Deploy y, cuando cierra el sprint, se archiva. Trello registra en su historial la fecha y la persona de cada movimiento, y ese historial respalda las fechas de este documento.
